



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие



Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



Проект “Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново ”, 2014 - 2020 г.

/кратко представяне на проекта/
септември 2014 г.

Изпълнител Обединение „Устойчиво развитие за Малко Търново“

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА

Основната цел на проекта е да се осигури необходимата висококвалифицирана консултантска помощ за община Малко Търново при разработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Този планов документ трябва да се разработи като ефективен инструмент за интегрирано градско планиране, при съблюдаване на изискванията на ОПРР и на Методическите насоки за разработване на ИПВГР за градовете от ниво 4, одобрени от Министерство на Регионалното развитие и благоустройството. Чрез ИПГВР на гр. Малко Търново ще се създадат необходимите предпоставки и условия за динамично и комплексно развитие на територията гр. Малко Търново, подобряване на качеството на живот на местната общност, съществено подобрение на условията за развитие на икономиката и повишаване на инвестиционната атрактивност на града и прилежащите му територии.

Специфични цели

- Създаване на ефективна организация за качествено разработване на ИПГВР на гр. Малко Търново;
- Задълбочена оценка на нуждите и очакванията на местната общност по отношение развитието на града в периода 2014-2020г.;
- Осигуряване на необходимата информационна основа за качествено и проблемно ориентирано интегрирано градско планиране (включително чрез използването на съвременни геоинформационни технологии);
- Постигане на високо ниво на конкретност при разкриване на проблемите и избора на интервенциите, предназначени за тяхното разрешаване;
- Създаване на благоприятни условия за развитие на град Малко Търново, чрез открит, прозрачен и публичен процес на планиране, чиито краен резултат ще бъде приет чрез обществен консенсус реалистичен интегриран план за градско възстановяване и развитие;
- Идентифициране и проучване на всички възможни източници и начини на финансиране и реализация на проектите в ИПГВР, включително публично-частни партньорства и механизми на финансовия инженеринг, предвидени в новите инициативи за устойчиво градско развитие на ЕС и в националното и европейско законодателство;
- Постигане на синергичен ефект между ИПГВР – Малко Търново и съществуващите стратегически планови и устройствени документи за интегрирано устойчиво регионално и местно развитие.

Основни резултати

Основен резултат от проекта ще бъде одобрен от УО на ОПРР ИПГВР на гр. Малко Търново.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Проектът е структуриран в 8 основни дейности, които са взаимнообвързани, така, че да доведат до успешното постигане на целите на проекта.

Дейност 1. Определяне на заинтересованите страни, оценка и анализ на нуждите и очакванията от бъдещият ИПГВР

- Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и др. които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на ИПГВР;
- Провеждане на кръгла маса;
- Изготвяне на индикативен списък със заинтересовани страни;
- Провеждане на анкетно проучване сред заинтересованите страни с цел идентифициране на нуждите и очакванията на местната общественост.

Дейност 2 Интеграция в целева информационна платформа на необходимите данни за територията на гр. Малко Търново, като същата ще се използва като основна платформа за анализ и генериране на информация

Дейност 3 Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в пространствено-функционален, социално-икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията на гр. Малко Търново с действащи устройствени планове/схеми

- Събиране на данни от официални източници и документи;
- Изпращане на официални запитвания до всички министерства относно проектите с национално значение, които ще бъдат изпълнявани на територията на община Малко Търново до 2020 г.;
- Организиране и провеждане на информационна среща;
- Провеждане на анкетно проучване сред местната общност (бизнес, НПО, администрация);
- Организиране и провеждане на експертни срещи;
- Експертна оценка на събраните данни;
- Изготвяне на комплексен, целеви, проблемен анализ за град Малко Търново;
- Разработване на SWOT анализ;
- Изготвяне на резюме на Анализа на настоящата ситуация.

Дейност 4 Формулиране на реалистична Визия за развитието на града с хоризонт 2020 г.

- Определяне на визия за развитието на град Малко Търново до 2020 г.;
- Провеждане на експертна среща и обществено обсъждане;
- Определянето на визията, тясно свързано с резултатите от анализа, дефинираните хоризонти в други документи за местно и регионално развитие, като и резултати от експертни срещи и обществено обсъждане.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Проектът е структуриран в 8 основни дейности, които са взаимнообвързани, така, че да доведат до успешното постигане на целите на проекта.

Дейност 5 Формулиране на ефективна стратегическа рамка на ИПГВР (стратегически цели, приоритети, мерки и конкретни проекти)

- Разработване на обща цел за осъществяване на ИПГВР;
- Разработване на специфични цели за осъществяване на ИПГВР;
- Формулиране на стратегия и план за реализация на ИПГВР;
- Провеждане на работни срещи;
- Списък с начините за финансово осигуряване реализацията на плана и неговия бюджет;
- Интеграция на резултатите от извършената екологична оценка.

Дейност 6 Изготвяне на Матрица – бюджет на индикативния списък на проектите и дейностите в ИПГВР

- Разработване на бюджет на ИПГВР;
- Съгласувана на финансовата стойност на бюджета с експерти и участници в процеса на разработване на ИПГВР;
- Обсъждане на разработеният бюджет на среща на работната група;
- Приемане на бюджет на ИПГВР на град Малко Търново.

Дейност 7 Разработване на механизъм за прилагане на плана, неговото наблюдение, контрол и актуализация.

- Предложение за система от индикатори за отчитане на ИПГВР;
- Разработване на План за управление и наблюдение на ИПГВР на община Малко Търново.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Проектът е структуриран в 8 основни дейности, които са взаимнообвързани, така, че да доведат до успешното постигане на целите на проекта.

Дейност 8 Осигуряване на ефективно прилагане на принципите на партньорство и публичност

- Покани до заинтересованите страни, които да участват в проучванията/обсъжданията (населението на общината, бизнес среди, специфични групи, носители на интереси по териториален, етнически, възрастов или друг признак, местни браншови организации на бизнеса, др.);
- Детайлно планиране на комуникационния подход за привличане на заинтересуваните страни;
- Използване на иновативни подходи чрез онлайн допитване и събиране на данни от заинтересуваните страни;
- Своевременно планиране и съгласуване на тема, дата и място за провеждане на публичните обсъждания, както и материалите за обсъждане;
- Публикуване на информация на интернет страницата на общината и в печатни или електронни издания;
- Представяне на обратна връзка към Възложителя за резултатите от провежданите анкетни проучвания;
- Предоставяне на обратна връзка към заинтересуваните страни чрез представяне на резюме от резултатите от проведените обсъждания, одобрени предложения, др – при възможност публикация на интернет страницата на общината;
- Пълно съобразяване на изискванията за публичност на ОП Регионално развитие при провеждане на публичните прояви.

ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Подходът за изпълнение ще бъде съобразен със следните параметри

- ИПГВР да е съобразен с принципите на устойчивото развитие на градовете – на града и на района от ниво 4 и да допринесе за прилагането на тези принципи в обхвата на конкретните територии;
- ИПГВР да спазва принципа на пространствено развитие, съчетаващ социално-икономическото и инфраструктурно развитие на градовете и урбанизираните им зони с актуалното устройствено планиране на градовете;
- ИПГВР да осигури приемственост и доразвитие в посока реализация на другите стратегически и планови документи на регионалното развитие и на териториалното устройство;
- ИПГВР да постигне максимална концентрация на ресурсите и синергичен ефект;
- ИПГВР да се разработва с най-широко гражданско участие – населението, бизнеса и специфичните групи, носители на групови интереси по териториален, етнически, възрастов или друг признак, а също така и представителните структури на бизнеса;
- ИПГВР да осигури обвързаност и ефект върху хоризонталните въпроси – устойчиво развитие, равни възможности и недискриминация, опазване и въздействие на околната среда, иновации и провеждане на политики;
- ИПГВР да бъде разработен и прилаган в условията на прозрачност и партньорство между местните и регионалните власти, неправителствения сектор, частните инвеститори, както и във взаимодействие с Управляващия орган на ОПРР;
- ИПГВР да включва списък с проектни предложения, критерии и обосновка за тяхното групиране в интегрирани пакети от проекти;
- ИПГВР да е реалистичен, съобразно финансовия и административен капацитети на община Малко Търново;
- ИПГВР да е съобразен и, при възможност, допринесе за развитието на регионалните връзки на града – в обхвата на агломерационния ареал и в по-широк териториален обхват, като осигурява условия за партньорство между отделни общини по дейности, които са от общ интерес;
- ИПГВР да е съпроводен от преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно ЗООС, ЗБР и подзаконовите нормативни актове;
- ИПГВР да съдържа реалистични и измерими индикатори, съгласно методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие;
- Извършване на услугите по разработване на ИПГВР при наличие на публичност, партньорство, координираност и обществена подкрепа чрез провеждането на публични обсъждания при планиране на бъдещото планиране на градското развитие;
- Изследване и прилагане на опит и добри европейски практики от други европейски градове при изработване на дългосрочни стратегически документи за интегрирано, устойчиво градско развитие и реализация на конкретни проекти;
- Отчетени стриктно предвижданията и очертаната рамка на интервенциите за интегрирано градско развитие на българските градове в Оперативната програма РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014 - 2020, с оглед значим принос за реализацията на нейните цели и приоритети;
- При изработването на ИПГВР да са спазени процедурите за неговото одобряване, съгласно методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Проектът е структуриран в 8 основни дейности, които са взаимнообвързани, така, че да доведат до успешното постигане на целите на проекта.

Дейност 1. Определяне на заинтересованите страни, оценка и анализ на нуждите и очакванията от бъдещият ИПГВР

Методология

- Събиране и анализ на информацията по отношение както на населението в неговата цялост по въпросите от общоградско значение, така и на специфични групи, носители на групови интереси по териториален, етнически, възрастов или друг признак, а също така и представителните структури на бизнеса.
- Таргетиране на нуждите на заинтересованите страни с оглед предвидените интервенции обект на ИПГВР;
- Провеждане на кръгла маса за идентифициране на заинтересованите страни;
- Дефиниране на набор от заинтересовани страни, които следва да бъдат включени в подготовката на ИПГВР или информирани по подходящ начин за интервенциите, които предвижда интегрирания план;
- Представяне на Възложителя на систематизиран списък на заинтересованите страни с кратка обосновка и предложение за структуриране на експертни групи.

Дейност 2 Интеграция в целева информационна платформа на необходимите данни за територията на гр. Малко Търново, като същата ще се използва като основна платформа за анализ и генериране на информация

Методология

- изграждането на ГИС система основно базирана върху данни от кадастрална карта;
- В хода на експертните обследвани на територията и обектите, събирането на статистически данни, както и данни от експлоатационни дружества ще се надгражда атрибутната информация за всеки един от обследваните обекти и елементи на градската среда.
- Атрибутна информация ще бъде структурирана по съпоставими показатели, при сравняването на които биха могли да се извършват анализи за състояние на обектите и елементите, да се правят изводи за тенденции в тяхното развитие и подреждането по приоритетност на бъдещите намеси.
- Към изградената база данни, концепцията на Изпълнителя предвижда да могат да бъдат добавени текущи и завършили проекти (с тяхното подробно описание), касаещи рехабилитацията и обновяването на елементите на градска среда (обновена градска среда, обновени сгради, рехабилитирани транспортни и инженерни мрежи).

МЕТОДОЛОГИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Проектът е структуриран в 8 основни дейности, които са взаимнообвързани, така, че да доведат до успешното постигане на целите на проекта.

Дейност 3 Изготвяне на цели и проблемен анализ на настоящата ситуация в пространствено-функционален, социално-икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията на гр. Малко Търново с действащи устройствени планове/схеми

Методология

- Събиране на данни от официални източници и документи
- Изпращане на официални запитвания до всички министерства относно проектите с национално значение, които ще бъдат изпълнявани на територията на община Малко Търново до 2020 г.;
- Организиране и провеждане на информационна среща на ръководителите на териториалните звена на общинската и държавната администрация;
- Провеждане на анкетно проучване сред местната общност (бизнес, НПО, администрация);
- Организиране и провеждане на експертна среща за проучване осигуреността на територията с действащи устройствени планове;
- Експертна оценка на събраните данни, вкл. с количествени и качествени методи – метод EVALSED, сравнителен метод, метода на динамиката, др;
- Изготвяне на комплексен, цели и проблемен анализ за град Малко Търново;
- Разработване на SWOT анализ;
- Изготвяне на резюме на Анализа на настоящата ситуация
- Разработване на интернет портал за целите на ИПГВР

МЕТОДОЛОГИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Проектът е структуриран в 8 основни дейности, които са взаимнообвързани, така, че да доведат до успешното постигане на целите на проекта.

Дейност 4 Формулиране на реалистична Визия за развитието на града с хоризонт 2020 г.

Методология

- Формулиране на визията на града до 2020 г. при съобразяване с резултатите на анализа, отчитане на постигнати стратегически цели за периода до 2013 г., както и регионални, национални, европейски стратегически документи;
- Проучване на добри практики в европейски контекст и прилагане при изпълнението на настоящата дейност – за осигуряване на финансиране за реализиране на проекти с национално и международно финансиране, както и със средствата на ПЧП механизма и комбинирането му с безвъзмездна помощ;
- Аналитичен подход за дефиниране на визията на база резултатите от предходните стъпки.
- Провеждане на онлайн проучване на общественото мнение сред обществеността по отношение избора на визия за развитие на града до 2020 г.
- Провеждане на експертна среща между началниците на отдели в администрацията, експерти и ръководството на Общината.
- Предложение за формулиране на Визия на града до 2020 г.

Дейност 5 Формулиране на ефективна стратегическа рамка на ИПГВР (стратегически цели, приоритети, мерки и конкретни проекти)

Методология

- Отчитане на ситуационна характеристика и оценка, свързани с: формулиране на изводи и проблеми – резултат от целеви и проблемни анализ на състоянието и потенциалите на гр. Малко Търново;
- Разработване на обща цел за осъществяване на ИПГВР на гр. Малко Търново;
- Разработване на специфични цели за осъществяване на ИПГВР на гр. Малко Търново;
- Формулиране на стратегия за осъществяване на ИПГВР на гр. Малко Търново;
- Провеждане на работни срещи с експерти от Общината в различни сфери в зависимост от спецификата на обсъжданите теми и проекти при разработването на основните части на стратегията на ИПГВР;
- Предложението за стратегия на ИПГВР на град Малко Търново

МЕТОДОЛОГИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Проектът е структуриран в 8 основни дейности, които са взаимнообвързани, така, че да доведат до успешното постигане на целите на проекта.

Дейност 6 Изготвяне на Матрица – бюджет на индикативния списък на проектите и дейностите в ИПГВР

Методология

- Разработване на бюджет на ИПГВР;
- Съгласуване на финансовата стойност на бюджета с експерти и участници в процеса на разработване на ИПГВР;
- Обсъждане на разработеният бюджет на среща на работната група;
- Приемане на бюджет на ИПГВР на град Малко Търново.

Дейност 7 Разработване на механизъм за прилагане на плана, неговото наблюдение, контрол и актуализация.

Методология

- Разработване на индикатори, произтичащи от очакваните резултати;
- Разработване на индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита синергичният ефект;
- Разработване на индикатори, свързани с въздействието върху развитието на територията;
- Предложение за система от индикатори за отчитане на ИПГВР;
- Разработване на План за управление и наблюдение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Малко Търново.

МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

Междинен резултат 1: Доклад за извършените цели, стратегически, проблемни и пространствени анализи и проучвания, като конкретен резултат от Дейности 1 и 2 и 3

- Идентифицирани заинтересовани страни по разработването на ИПГВР – Малко Търново;
- Резултати и анализ/изводи от проучването на нуждите и очакванията на идентифицираните заинтересовани групи;
- Преглед и оценка на общата характеристика на гр. Малко Търново и община Малко Търново;
- Резултати от проучването на зоните за обитаване, производствените/ индустриални зони, деривативните зони, проблеми с интегрален характер;
- Резултати от проучването на налични проектни идеи и разработени проекти, осигуреност на територията с действащи устройствени планове и схеми;
- SWOT анализ и резюме, с изводи относно наличието на градски територии в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, решаването на чиито проблеми изисква да бъдат прилагани инструментите на интегрираното развитие и планиране;
- Актуализиран план-график за следващите стъпки по проекта;
- Доклади за резултатите от предвидените анкетни проучвания в рамките на Дейности 1 и 3.

Междинен резултат 2: Като конкретен резултат от Дейности 4 и 5

- Визия за развитието на гр. Малко Търново за периода до 2020 г.;
- Резултати от проведени обществени обсъждания за визията за развитие на града. Информация за отразени предложения и препоръки по представените за обществено обсъждане.

Междинен резултат 3: Елементите на Междинен резултат 1 ще бъдат обединени с анализа по Междинен резултат 2, с цел изготвяне на интегриран Доклад за проведен териториален, проблемен и социално-икономически анализ, формулирана визия, съгласно Методическите насоки

- Целеви и проблемни анализи на настоящата ситуация в социално-икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове/схеми;
- Резюме на целевия и проблемни анализи (до 5 страници);
- Визия за развитието на гр. Малко Търново до 2020 г.;
- Информация за проведените обществени обсъждания.

Междинен резултат 4: Стратегическата и планова рамка на ИПГВР – Малко Търново

- Описание на плана като съвкупност от общи и специфични цели, мерки, проекти и дейности, списък на участниците (заинтересованите страни) в обществените обсъждания;
- Начините за финансово осигуряване реализацията на плана, бюджет на плана, възможни публични и частни източници на финансиране на национално и международно ниво, както и приложими схеми на публично-частни партньорства;
- Съгласуваност между ИПГВР и други стратегически документи на национално и регионално ниво;
- Програма за реализация на ИПГВР;
- Механизъм за прилагане на плана, неговото наблюдение, контрол и актуализация, включително индикатори за наблюдение и оценка, организация и структура за контрол и мониторинг на изпълнението, интегрирана система за планиране и управление на територията
- Матрица - бюджет на индикативния списък на проектите и дейностите в ИПГВР.

РАМКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Основни експерти от екипа, ще участват в реализирането на планираните дейности по проекта.

Основен екип на Изпълнителя

Основният екип на Изпълнителя включва Ръководител на екип, 6 ключови експерти

Ръководител проект – КЕ1 - Стоян Цветков

Специалист по устройство на територията КЕ 2 – арх. Теодор Делев

Специалист по геодемография КЕ3 – Пенка Кирова

Специалист по градска и регионална икономика КЕ4 - ст.н.с. д-р Юлия Спиридонова

Специалист по пространствени анализи КЕ5 - Лозана Йорданова

Юрист КЕ6 - Мария Петрова

Финансов експерт КЕ7 - Христо Йовков

Допълнителни Неключови експерти:

Неключов експерт 1 Европейско финансиране - Силвия Тодорова

Неключов експерт 2 Стратегическо планиране – Десислава Сиракова

Неключов експерт 3 Право, включително в областта на ПЧП – Димитър Хаджигеоргиев

Неключов експерт 4 Експерт „Вик” - Петър Въчев

Неключов експерт 5 „Ел. Системи” - Николай Антипешев

Неключов експерт 6 „Озеленяване” – Стоянка Гигова

Неключов експерт 7 Геодезия – Бойко Янчев

Неключов експерт 8 Техническа инфраструктура и комуникационно-транспортни системи - Фредерика Жадалова

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Изпълнението на проекта се реализира в много динамична среда и изключително кратки срокове. Отчитайки тези фактори, управлението на риска е изключително важен елемент за постигане на планираните резултати по проекта.

Риск:

- Забавяне или липса на финансиране

Подход за управление:

- За управлението на риска, Изпълнителят е предвидил като част от нужната информация от страна на Възложителя да се предоставя актуална и своевременно информация за промени, които могат да повлияят върху целите и резултатите на поръчката.
- Участникът разполага с достатъчно наличен ресурс да изпълнява възложените дейности независимо от забавяние в плащане на междинни етапи.

Риск:

- Промяна на законодателната рамка по време на изпълнение на договора

Подход за управление:

- Изпълнителят ще осигури преодоляване на риска като предложи гъвкав подход при наличие на подобен риск, като ще съобрази изпълнението на дейностите, обвързани с промените в нормативната уредба.
- Изпълнителят ще осигури намаляване на риска чрез непрекъснато проследяване от експертния екип на нормативната уредба на ниво ЕС, държава, регион и община в процеса на изпълнение.
- Ще се следят внесените мотиви към предложения за изменение на нормативни актове, за да има възможност за ранно реагиране. Същевременно Консултантът е готов да алкира допълнителен експертен ресурс за навременното решение.

Риск:

- Закъснение на изпълнението на договора

Подход за управление:

- Периодът за изпълнение на дейностите, предвиден от Изпълнителя е реалистичен, предвид очакваната и поддържана добра комуникация между страните и опита със сходни проекти.
- Изпълнителят е предвидил междинни срокове в графика за изпълнение, които са вътрешни, които ще бъдат подлагани на контрол.
- При изготвяне на графика са заложили и кратки резервни периоди, които са служат като своеобразен буфер при забавяне на някоя от дейностите. Същевременно Консултантът е готов да алкира допълнителен експертен ресурс за навременното решение.

Риск:

- Некачествено изпълнение на предвидените дейности от консултанта

Подход за управление:

- Изпълнителят разполага с отлични експерти, притежаващи сериозен опит в работата по Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, както и по други административни документи и процедури, което минимизира посочения риск.
- Ще бъдат определени отговорни лица от двете страни за проследяване на качеството и сроковете за изпълнените дейности.
- Ще бъде използвана максимално изчерпателна входна информация и данни, вкл. и закупени за сметка на Изпълнителя напр. от НОИ, АЗ и др.

ВРЕМЕВИ ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА

Представеният работен план е със срок на изпълнение

10 МЕСЕЦА

в съответствие с

предвиденото в Заданието на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя.

Изпълнението на проекта се реализира в много динамична среда и изключително кратки срокове. Отчитайки тези фактори, управлението на риска е изключително важен елемент за постигане на планираните резултати по проекта

ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ	РАБОТНА ПРОГРАМА в месеци										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ДЕЙНОСТ 1 – Определяне на заинтересованите страни, оценка и анализ на нуждите и очакванията от бъдещият ИПГВР	■										
ДЕЙНОСТ 2 – Интеграция в целева информационна платформа на необходимите данни за територията на гр. Малко Търново, като същата ще се използва като основна платформа за анализ и генериране на информация	■	■									
ДЕЙНОСТ 3 - Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в пространствено-функционален, социално-икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията на гр. Малко Търново с действащи устройствени планове/схеми	■	■	■	■							
ДЕЙНОСТ 4 – Формулиране на реалистична Визия за развитието на града с хоризонт 2020 г.				■	■						
ДЕЙНОСТ 5 – Формулиране на ефективна стратегическа рамка на ИПГВР (стратегически цели, приоритети, мерки и конкретни проекти)					■	■	■	■	■	■	
ДЕЙНОСТ 6 – Изготвяне на Матрица – бюджет на индикативния списък на проектите и дейностите в ИПГВР							■	■	■		
ДЕЙНОСТ 7 – Разработване на механизъм за прилагане на плана, неговото наблюдение, контрол и актуализация								■	■		
ДЕЙНОСТ 8 – Осигуряване на ефективно прилагане на принципите на партньорство и публичност				■	■						■

В червено са посочени ключовите моменти за изпълнение на договора

НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ

Провеждане на Анкетно проучване по Дейност 8 в рамките изпълнение на Дейност 1

Старт на изпълнението по Дейност 8 в рамките на Дейност 1:

Целта на анкетата е да се очертае актуалната ситуация в град Малко Търново към момента, проблемите в инфраструктурата на града, за да се идентифицират проектни идеи.

Анкетата е достъпна за попълване по електронен път:


<http://anketa-mt.questionpro.com/>

както и от информационния сайт на Община Малко Търново:


<http://www.malkotarnovo.org/>

Анкетата ще бъде активна до 15 октомври 2014 г.!

ГР. МАЛКО ТЪРНОВО - СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

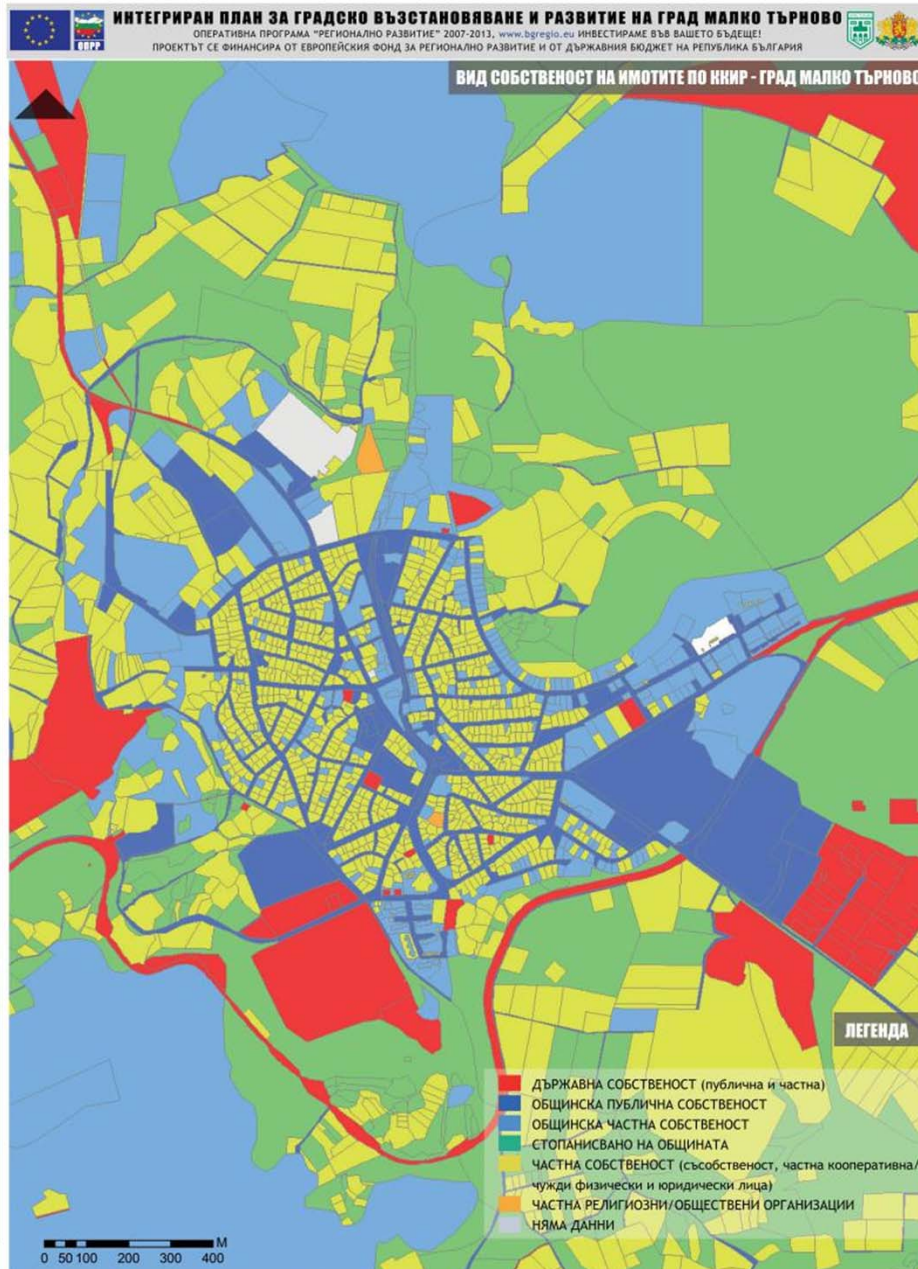

Този документ е създаден в рамките на проект "Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново", осъществяван с финансовата поддръжка на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Малко Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

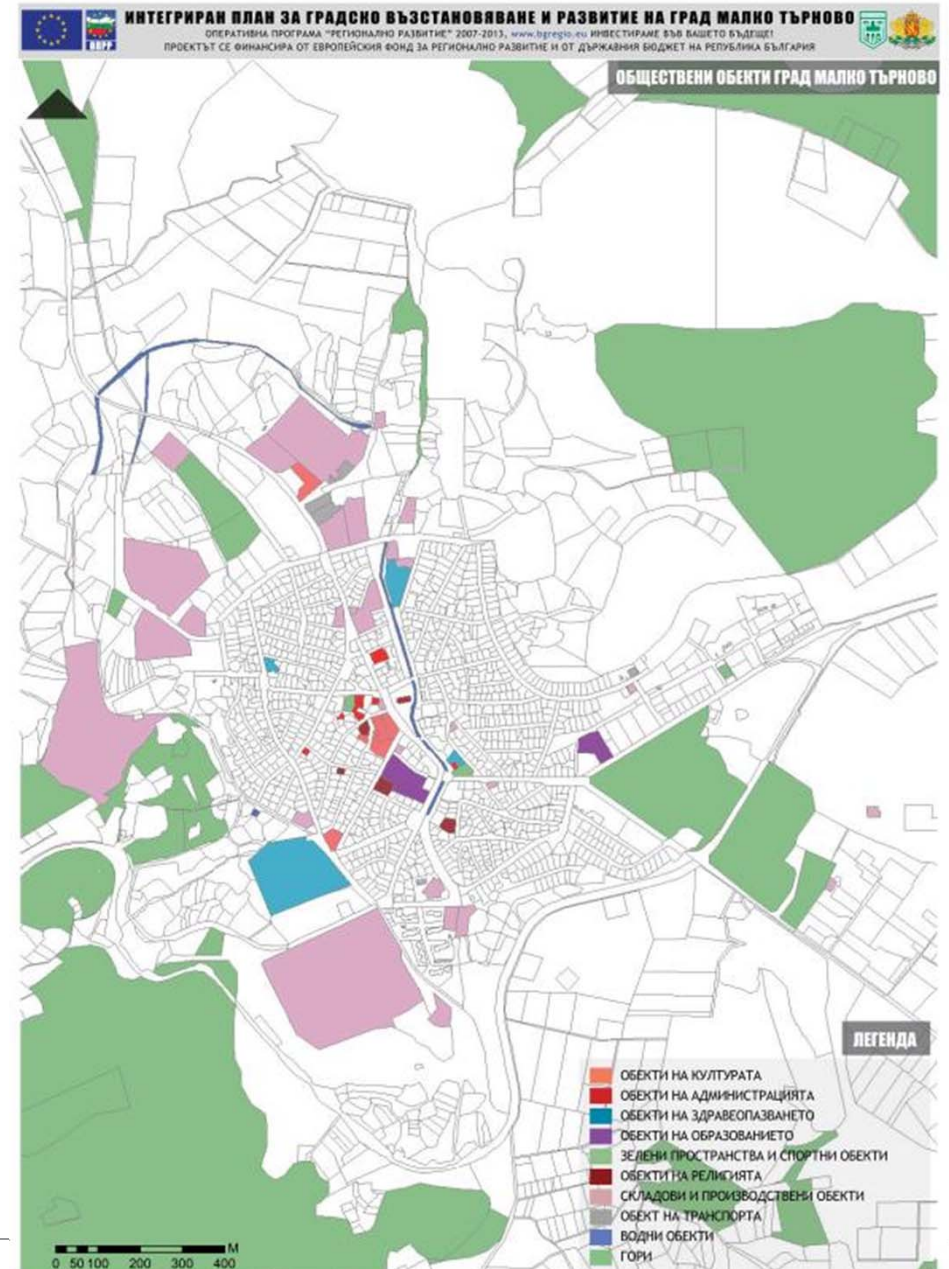

Този документ е създаден в рамките на проект "Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново", осъществяван с финансовата поддръжка на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Малко Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие



Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Можете да се свържете с нас като ни пишете на:

ipgvr@ip-arch.com

Проект “Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново”,
2014 - 2020 г.

Изпълнител Обединение „Устойчиво развитие за Малко Търново“
